

# 主な作業の流れ

〈浪速区側参考図〉

## 鋼管矢板打設工

- ① 浪速区側の既設堤防の前に鋼管矢板を打込みます。
- ①-2 西区側の既設堤防の前に鋼管矢板を打込みます。



## 地盤改良工

- ② 浪速区側の河床地盤を改良します。



## 埋戻し工

- ③ 浪速区側の鋼管矢板と既設堤防の間を土(砕石)で埋めます。



## 笠コンクリート工

- ④ 浪速区側の鋼管矢板の上部をコンクリートで固めます。




## 被覆コンクリート工

- ⑤ 浪速区側の③で埋めた部分をコンクリートで固めます。その後立入防止柵を設置します。



## 二次浚渫工

- ⑥ 浪速区側の河床地盤を整地します。

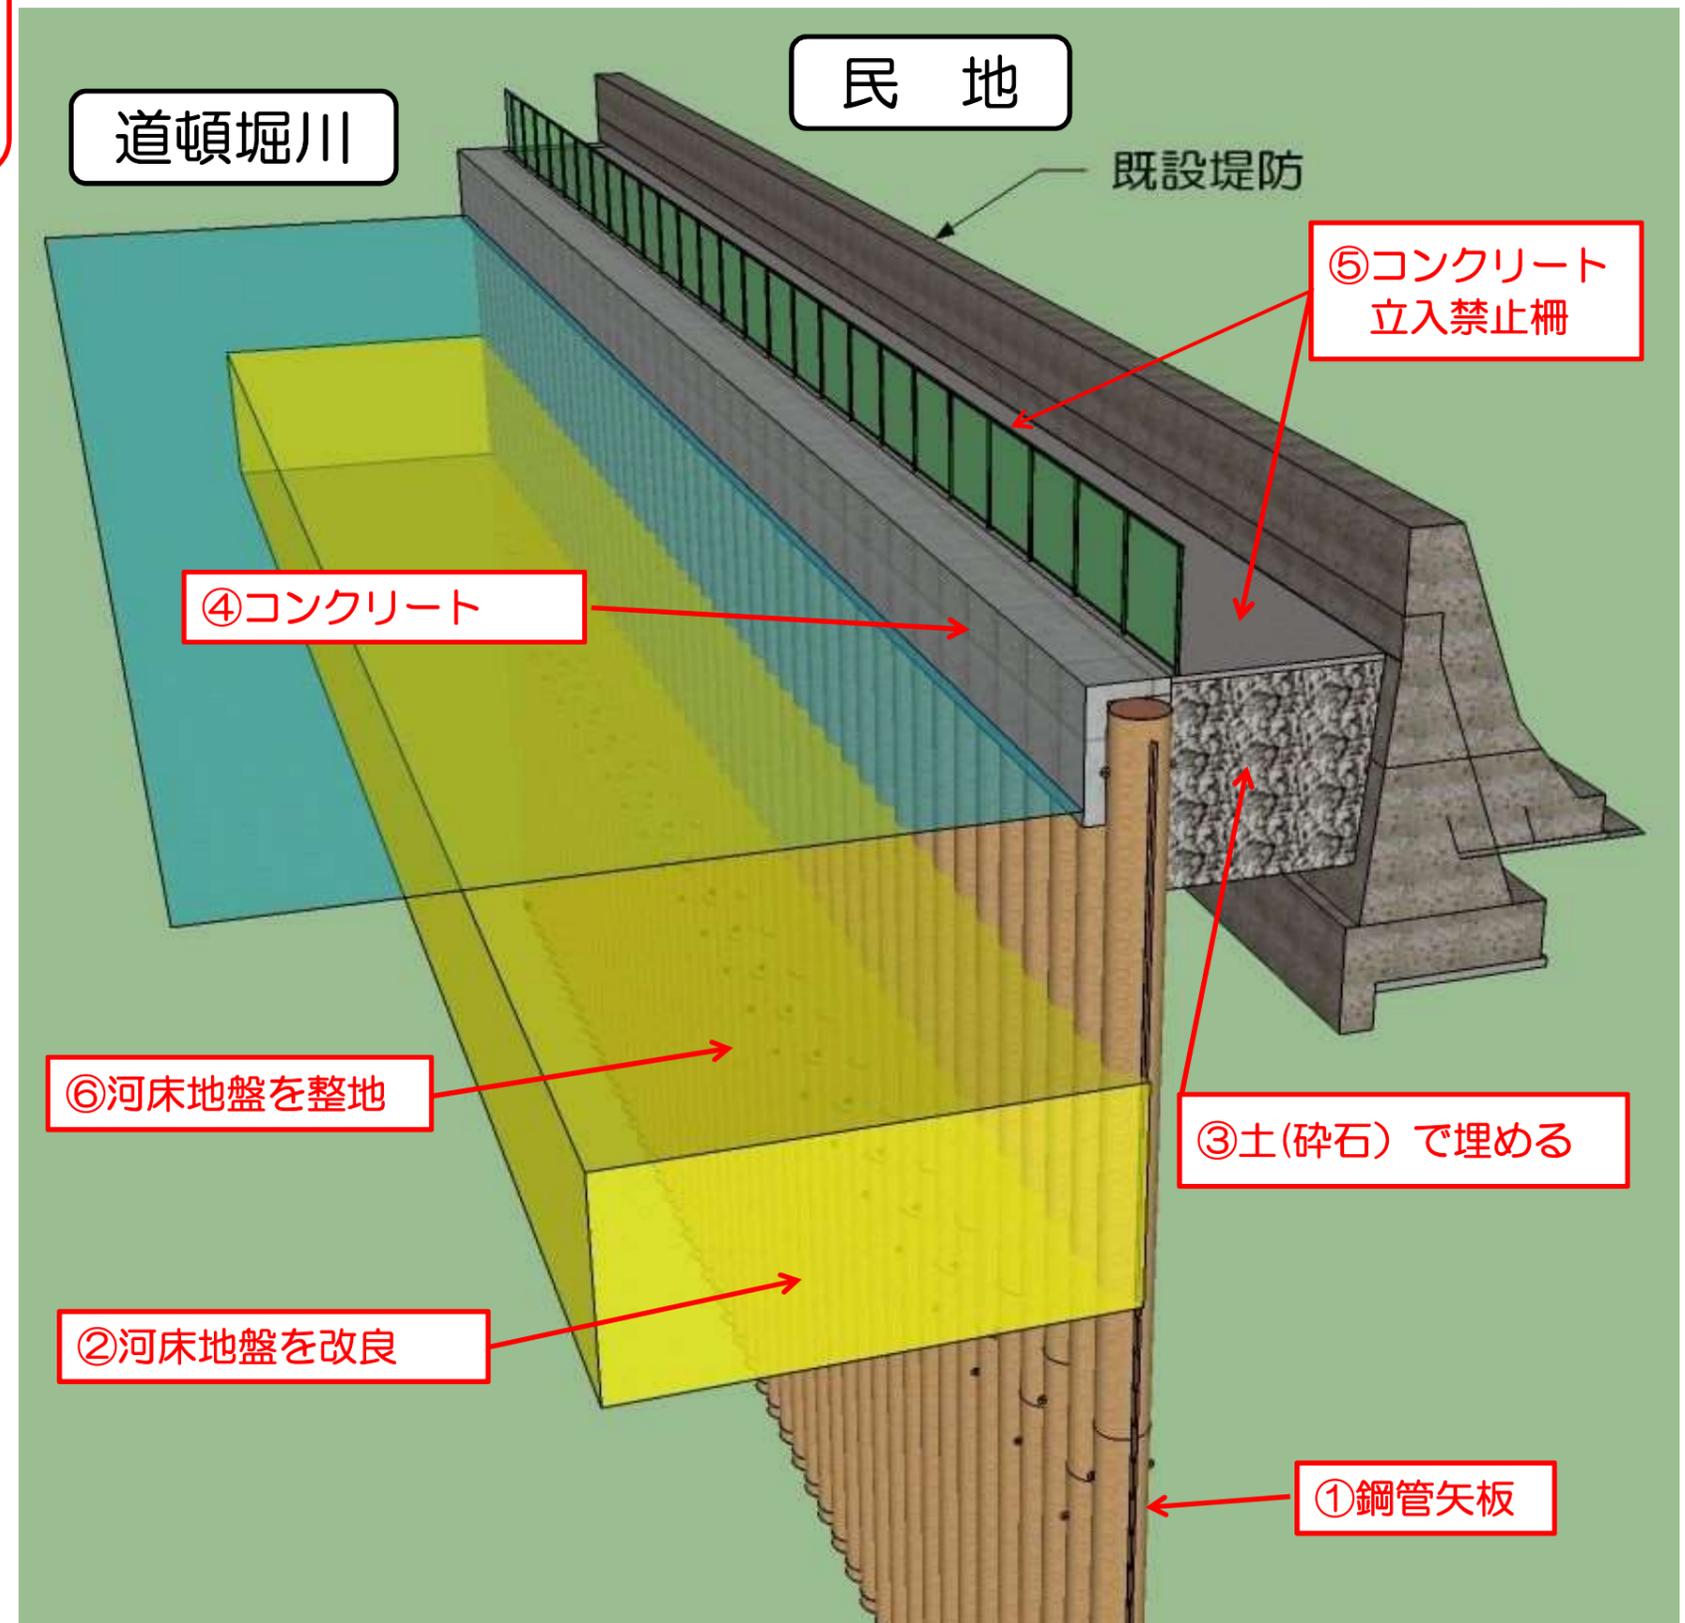

※工事の順序や時期はあくまで予定です。  
状況により変更する可能性があります。
